Redatto: Ing. Alessandro Papparotto
Verificato: Ing. Alessandro Papparotto
Approvato: Semesteb S.r.l.

# CRONOPROGRAMMA REALIZZ. PARCO SOLARE MILLEACQUE
## COMUNE DI UDINE

**Allegato 12**
**Progetto Definitivo**

semesteb

| ID | Nome attività | Risorse | Durata/mesi |
|---|---|---|---|
| 1 | Ottenimento Decreto Autorizzazione Unica (AU) Regionale | Regione FVG | 0 |
| 2 | **REALIZZAZIONE PARCO SOLARE MILLEACQUE** | | **46** |
| 3 | **Adattamento Progetto a event. Prescrizioni in AU** | Semesteb | 3 |
| 4 | **Progettazione esecutiva opere di rete** | e-distribuzione | 2 |
| 5 | **Progettazione esecutiva** | Semesteb / EPC | 4 |
| 6 | **Finanziamento** | Semesteb / EPC | 24 |
| 7 | **Convenzione con amministrazione comunale** | Comune / FVG | 2 |
| 8 | **Appalti** | Semesteb / EPC | 7 |
| 9 | **Costruzione opere connessione di rete** | e-distribuzione | 6 |
| 10 | **Costruzione dell'impianto fotovoltaico** | Semesteb / EPC | 6 |
| 11 | **Possibili ritardi** | n.d. | 4 |
| 12 | **Messa in esercizio dell'impianto di produzione** | e-distribuzione | 1 |
| 13 | **Chiusura lavori** | Comune | 1 |

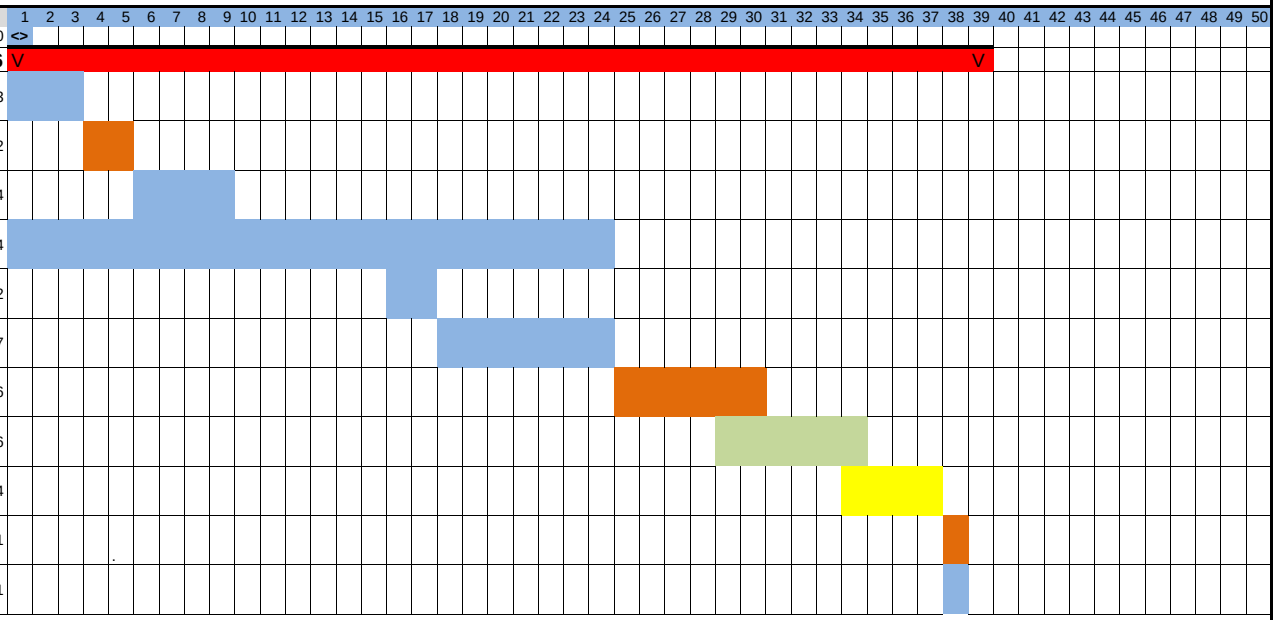


**Progettista: Dott. Ing. Alessandro Papparotto**

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI UDINE
Dott. Ing. ALESSANDRO PAPPAROTTO
Laurea Specialistica Sezione A
Settori: a - b - c
N° 2502

Firmato digitalmente da: PAPPAROTTO ALESSANDRO
Data: 06/10/2021 17:11:51

*Ph.D. Ing. A. Papparotto*
